



งวดงานงวดเงิน

โครงการก่อสร้าง

ชุมประทูทางเข้าและส่วนตกแต่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี

Handwritten signature and date: 11/11/2564

งวดงานงวดเงิน
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูทางเข้าและส่วนตกแต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งวดที่ 1 จะจ่าย 5% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

- สำรวจปักผังบริเวณ
- ปรับพื้นที่ถมดินส่วนบริเวณซ่อมประตูทางเข้า พร้อมบดอัด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของดินถม และบดอัด
แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


งวดที่ 2 จะจ่าย 15% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

- คอกเข็ม ฐานป้อมยาม ฐานกำแพงรั้ว ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ตัดหัวเข็ม หล่อฐานราก เสาค่อม่อ ฐานป้อมยาม ฐานกำแพงรั้ว ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อฐานรากผนังกันดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อคาน ชั้น 1 ป้อมยาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อเสา ชั้น 1 ป้อมยาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นชั้น 1 ป้อมยาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อคาน ชั้น 2 ป้อมยาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อเสา ชั้น 2 ป้อมยาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อเสากำแพงรั้ว ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อผนังกำแพงกันดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่าย 15% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

- หล่อคาน เสา พื้นชั้นหลังคา ป้อมยาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐกำแพงรั้ว ซุ้มประตู แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐงานป้าย ซุ้มประตู ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าใต้ดินแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเหล็กรั้ว ซุ้มประตู แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐกำแพงรั้ว ซุ้มประตู ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ชักร่อง กำแพงรั้วซุ้มประตู แล้วเสร็จ

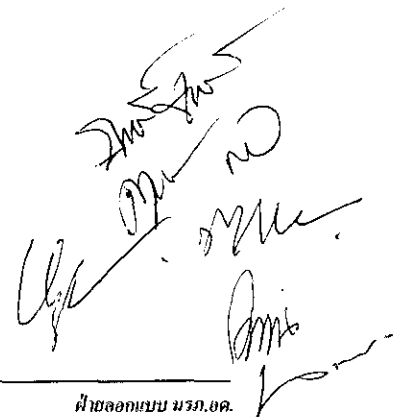

- ฉาบปูนซักร่อง งานป้าย ขุมประตู่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าใต้ดินแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเหล็กกรัว ขุมประตู่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ซักร่อง กำแพงขุมประตู่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทำผิวพื้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทำผิวผนัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบรดน้ำสนาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ปรับดิน ลงทรายปลูกหญ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ของขุมประตู่ทางเข้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่าย 15% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั้นล่าง ด้าน A ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั้นบน ด้าน A ทั้งหมด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 170 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่าย 15% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

- ดำเนินการทาสีรั้วด้าน A ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั้นล่าง ด้าน B แล้วเสร็จ 1,000 เมตร
- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั้นบน ด้าน B แล้วเสร็จ 500 เมตร

แล้วเสร็จภายใน 215 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่าย 20% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั้นล่าง ด้าน B แล้วเสร็จ 2,000 เมตร
- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั้นบน ด้าน B แล้วเสร็จ 1,200 เมตร

แล้วเสร็จภายใน 275 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

วงคกรที่ 7 จะจ่าย 15% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั้นล่าง ด้าน B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั้นบน ด้าน B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทาสีรั้วทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ส่ง AS BUILT DRAWING แล้วเสร็จ
- ดำเนินงานตามรายละเอียดอื่นๆส่วนที่เหลือ ในแบบรูปรายการ ตามสัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Signature
Date
Signature
Date
